


Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS PODBRDSKO 2014 - 2020



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

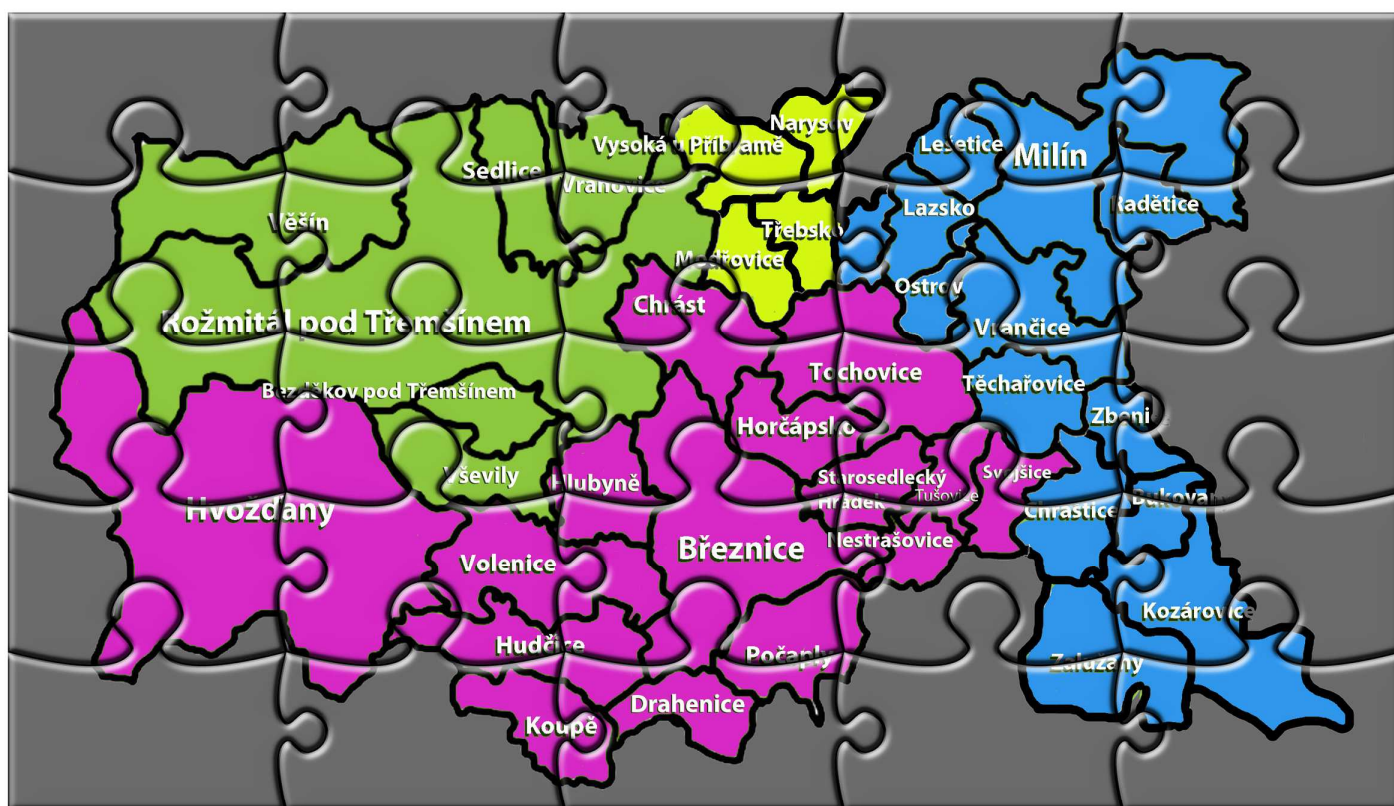

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Středočeský kraj

PŘÍLOHA SCLLD MAS PODBRDSKO

4. Analýza rizik

Analýza rizik

Následující tabulka analyzuje rizika z pohledu jejich očekávaného pravděpodobnostního výskytu a zároveň jeho dopadu resp. vlivu na realizaci strategie. Celkové hodnocení úrovně rizika je bodově hodnoceno jako součin pravděpodobnosti a jejího dopadu. Rizika jsou rozdělena do 4 skupin. U každého rizika je identifikován jeho nositel a zároveň jsou popsány opatření k řízení rizik.

Kategorie očekávané pravděpodobnosti.

1 – téměř vyloučené, 2 – nepravděpodobné, 3 – možné, 4 – pravděpodobné, 5 – téměř jisté

Dopad rizika

1 – téměř neznamenný, 2 – drobný, 3 – významný, 4 – velmi významný, 5 – katastrofický

Úroveň rizika

Úroveň rizika je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu (úroveň rizika = D*P)

Identifikace rizika	Hodnocení rizika			Opatření k řízení rizik	Nositel rizika
	Pravděpodobnost (P)	Dopad (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků spolufinancování na realizaci strategie	5	5	25	Informování potenciálních příjemců, koncentrace vlastních zdrojů.	Realizátoři projektů
Zaměření MAS pouze na zdroje z relevantních ESI fondů	3	3	9	Monitoring národních, regionálních a vlastních zdrojů	Kancelář MAS
Nedostatečné finanční zajištění provozu MAS v období realizace strategie	3	5	15	Finanční plánování ve vazbě na finanční prostředky z IROP a vlastních zdrojů.	Valná hromada MAS
Nedostatečné čerpání alokace v jednotlivých opatřeních	2	3	6	Podpora tvorby absorpční kapacity v území.	Kancelář MAS
Organizační riziko					
Nedostatečné manažerské řízení realizace strategie	1	5	5	Kvalifikovaný manažer pro realizaci SCLLD	Kancelář MAS
Nedostatečná personální kapacita na zajištění realizace strategie	3	5	15	Sestavení kvalifikovaného a zkušeného týmu.	Kancelář MAS
Nedostatečná komunikace v území	1	3	3	Důsledná aplikace komunikačních nástrojů v území.	Kancelář MAS
Právní riziko					
Aplikace právních předpisů v oblasti provádění veřejných zakázek	4	4	16	Zakomponování časových rizik do projektového řízení.	Realizátoři projektů
Aplikace závazných předpisů pro čerpání finančních prostředků z ESI fondů	3	4	12	Monitoring změn v přepisech a komunikace s ŘO.	Kancelář MAS, realizátoři projektů
Změny v pravidlech realizace SCLLD	4	4	16	Monitoring změn v pravidlech a komunikace s ŘO.	Kancelář MAS
Věcné riziko					
Dodržování harmonogramu finančního plánu	3	5	15	Podpora tvorby absorpční kapacity v území, projektové řízení.	Kancelář MAS
Změna podmínek v území v průběhu realizace strategie	2	3	6	Monitoring podmínek v území.	Valná hromada MAS
Vysoká četnost podstatných změn v SCLLD	3	4	12	Projektové řízení a koncentrace podstatných změn.	Kancelář MAS

Zdroj: vlastní zpracování
